



Propuesta Técnica y Económica

SAP Automatización y Monitoreo de Facturas
de proveedores

14/1/2026

Contenido

1.	Run Business Solutions	4
2.	Acuerdo de Confidencialidad	4
3.	Resumen Ejecutivo	4
4.	Situación Actual	4
5.	Objetivo y Alcance de la propuesta	5
5.1.	Objetivo	5
5.2.	Alcance Funcional y propuesta de Solución	5
5.3.	Fuera de Alcance	9
5.4.	Idioma, geografía, días y horarios	9
6.	Estrategia de Implementación	10
6.1.	Metodología	10
6.2.	Cronograma del proyecto	10
6.3.	Entregables	10
6.4.	Equipo de proyecto	10
7.	Premisas y Supuestos	11
7.1.	Organización del trabajo	11
7.2.	Definiciones y entregables del proyecto	12
7.3.	Tiempos	13
7.4.	Desarrollo del proyecto	13
7.5.	Aspectos técnicos	14
8.	Propuesta Económica	14

Nombre del documento: Propuesta Técnica y Económica SAP Automatización y Monitoreo de Facturas de proveedores

Tabla de Revisión

La siguiente tabla detalla las versiones del documento, incluyendo la fecha de publicación, una descripción breve de los cambios realizados, el autor responsable y el periodo de validez correspondiente.

versión	Fecha	Descripción	Autor	Validez
1.0	14/01/2026	Creación del documento y primer envío al cliente.	Lorena Achury	14/02/2026

Este documento representa una oferta formal de **Run Business Solutions** para el servicio Automatización y Monitoreo de Facturas de proveedores, garantizando calidad, compromiso y eficiencia en la gestión de los procesos tecnológicos de **SOYCHU**.

1. Run Business Solutions

Somos una empresa en constante crecimiento, comprometida con apoyar a nuestros clientes en alcanzar sus metas. Brindamos servicios de asesoría, implementación, operación y soporte, adaptados a las necesidades específicas de cada organización. Con una visión innovadora y un plan estratégico sólido, hemos expandido nuestra experiencia en Latinoamérica y Europa, ofreciendo un acompañamiento integral que impulsa el éxito y el desempeño empresarial.

2. Acuerdo de Confidencialidad

El contenido de este documento debe ser tratado como propiedad confidencial de **Run Business Solutions**, no pudiendo ser divulgado a terceros sin previa aprobación. Este documento no podrá ser reproducido de manera parcial o integral, tampoco utilizado para otros fines que no sea la evaluación de propuestas sin previo consentimiento de **Run Business Solutions** y bajo la condición de que sean incluidas notas sobre los derechos autorales de **Run Business Solutions** u otros en la referida reproducción.

Ninguna información sobre el contenido o temas de esta propuesta podrá ser entregada o comunicada de cualquier forma – sea cual sea – para terceros sin previo consentimiento de **Run Business Solutions**.

Run Business Solutions garantiza – por parte de los que prepararon este documento – que todo el cuidado necesario fue aplicado en su preparación y que valida su contenido hasta la fecha prevista para su expiración.

Run Business Solutions no puede, en tanto, garantizar la veracidad de los materiales que estén fuera de su control y de la misma manera no podrá garantizar la validez de las informaciones que no estén en este documento.

3. Resumen Ejecutivo

A RUN BUSINESS SOLUTIONS complace presentar la siguiente propuesta a SOYCHU para el servicio Automatización y Monitoreo de Facturas de proveedores. Entendemos la importancia de esta iniciativa para SOYCHU y ponemos a disposición nuestra experiencia y equipo de consultores para asegurar su éxito.

Estamos comprometidos con la exitosa ejecución de esta iniciativa y entendemos que la misma forma parte de una relación de negocios de largo plazo.

4. Situación Actual

Actualmente SOYCHU cuenta con la solución SAP ECC 6.0 (ERP) para la gestión de sus procesos de negocio. Sin embargo, los mecanismos actuales de relación con proveedores no están integrados con su sistema SAP, lo que dificulta contar con un control unificado de la información y la documentación obligatoria.

Se identifica la necesidad de servicio Automatización y Monitoreo de Facturas de proveedores que permita optimizar esta gestión, brindando mayor eficiencia, transparencia y trazabilidad en la interacción con la red de abastecimiento.

5. Objetivo y Alcance de la propuesta

5.1. Objetivo

El objetivo de la presente propuesta es optimizar y agilizar el proceso de recepción, validación, carga y control de facturas de proveedores, mediante la implementación de un flujo automatizado que permita reducir significativamente la gestión manual asociada al procesamiento de entre 3.500 y 5.000 comprobantes mensuales en SAP (MIRO / FB60).

La solución busca acelerar el ingreso y trazabilidad de los comprobantes, incorporando controles automáticos y un esquema de seguimiento proactivo de facturas emitidas y pendientes de recepción, a través de la integración con ARCA/AFIP.

Se contempla que ciertos escenarios requerirán intervención manual, ya sea por excepciones, faltantes de información o validaciones específicas, así como también la existencia de casos que podrán ser cargados por fuera del flujo automatizado, según criterios operativos definidos por el negocio.

Se busca que el trabajo repetitivo, y que sigue el flujo esperado, se realice de forma automática, y que la intervención manual sea sólo para casos de excepción.

5.2. Alcance Funcional y propuesta de Solución

La propuesta contempla la implementación de dos componentes complementarios e integrados, diseñados para cubrir de manera integral el ciclo completo de gestión de facturas de proveedores, desde su recepción y carga automática en SAP, hasta el monitoreo, control y seguimiento de comprobantes fiscales emitidos y pendientes, asegurando trazabilidad, eficiencia operativa y cumplimiento fiscal.

Ambos componentes operan de forma coordinada, permitiendo no solo automatizar la operación diaria, sino también incorporar una capa de control proactivo y preventivo, reduciendo riesgos, reprocesos y dependencias manuales, y brindando al negocio una visión clara y centralizada del estado de sus comprobantes.

Esta arquitectura modular facilita:


- La reducción significativa de tareas manuales y errores operativos.
- La mejora en los tiempos de procesamiento y contabilización.
- El fortalecimiento del control fiscal y la conciliación de información.
- La escalabilidad futura de la solución ante incrementos de volumen o nuevas integraciones.

1. Automatización de la Carga de Facturas de Proveedores

Se implementará un proceso end-to-end totalmente automatizado para la recepción, interpretación, validación y carga de comprobantes de proveedores en SAP, eliminando la intervención manual en las transacciones MIRO y FB60 y asegurando trazabilidad completa del proceso.

La solución estará diseñada para soportar altos volúmenes de facturación mensual (3.500 a 5.000 comprobantes), manteniendo consistencia en los datos, reducción de errores humanos y mejora en los tiempos de procesamiento.

✓ **Recepción y Orquestación (Office 365)**

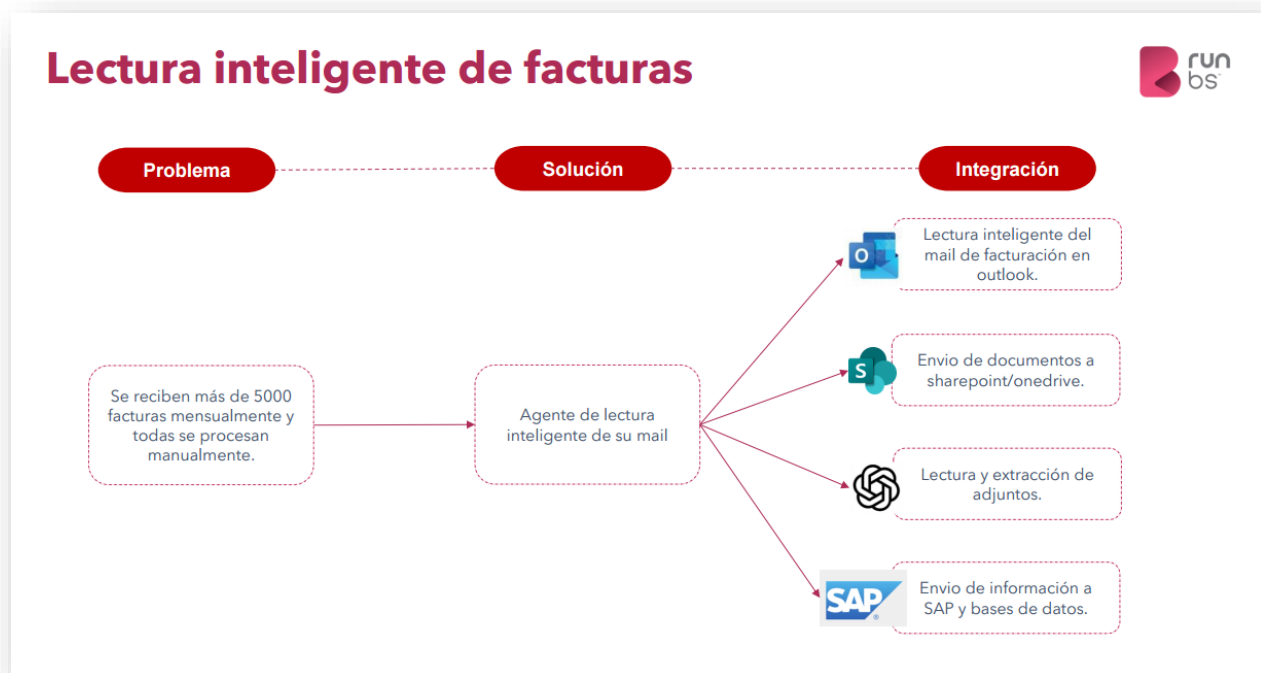

- Monitoreo continuo y automatizado de la casilla de correo designada en Office 365, definida como canal oficial de recepción de facturas.
- Identificación y descarga automática de los comprobantes adjuntos recibidos por correo electrónico.
- Control de duplicidad y validación de archivos recibidos (formato, legibilidad, adjuntos válidos).
- Orquestación del flujo completo, asegurando la correcta secuencia entre recepción, procesamiento, validación y carga en SAP.

✓ **Procesamiento Inteligente de Comprobantes (IA / OCR)**

- Envío automático de los comprobantes extraídos a un servicio de Inteligencia Artificial con capacidades avanzadas de OCR + IA, especializado en documentos fiscales.
- Lectura e interpretación del documento, independientemente de su formato visual.
- Extracción estructurada de los datos clave necesarios para la contabilización en SAP, entre ellos:
 - **CUIT / RUC del proveedor**
 - **Fecha del comprobante**
 - **Importe neto, impuestos y total**
 - **Moneda y tipo de cambio**
 - **Tipo de comprobante**
 - **Datos fiscales relevantes del emisor**
- Normalización de la información extraída para asegurar consistencia con los formatos y reglas del sistema SAP.

2. Monitor de Comprobantes Pendientes - Integración ARCA / AFIP

Se implementará un monitor de control y gestión proactiva orientado a brindar visibilidad completa sobre los comprobantes fiscales emitidos por los proveedores que aún no han sido recibidos, procesados o correctamente contabilizados en SAP.

Este componente complementa la automatización de carga, incorporando una capa de control fiscal y operativo, que permite anticipar desvíos, reducir riesgos de omisiones y asegurar consistencia entre la información fiscal oficial y los registros internos del sistema.

✓ **Integración con ARCA / AFIP**

- Implementación de una integración para la consulta periódica de los comprobantes fiscales emitidos a nombre de la empresa, según la información disponible en ARCA/AFIP.
- Obtención de los datos fiscales relevantes de cada comprobante, tales como:
 - CUIT del proveedor
 - Tipo y número de comprobante
 - Fecha de emisión
 - Importe total
 - Estado fiscal informado por el organismo
- Almacenamiento estructurado de la información consultada para su posterior análisis y conciliación.


✓ **Conciliación Automática de Comprobantes**

- Comparación automática entre:
 - **Facturas recibidas y procesadas** ya sea que fueron cargadas a través del flujo automatizado de Office 365 + IA + SAP, o de manera manual por el usuario.
 - **Facturas emitidas** y registradas oficialmente en ARCA/AFIP, pero aún no recibidas por SOYCHÚ.
- Identificación de diferencias, ausencias o inconsistencias entre ambos universos de información.
- Clasificación automática del estado de cada comprobante según reglas de conciliación predefinidas.

✓ Reporte de Gestión - Semáforo de Comprobantes

Se generará un reporte de gestión centralizado, que permitirá visualizar de manera clara y accionable el estado de los comprobantes, mediante un esquema de semáforo:

- **Verde:**
Factura recibida, procesada y cargada correctamente en SAP, sin inconsistencias.
- **Amarillo:**
Factura recibida en la casilla de **Office 365**, pero **aún no ha sido procesada completamente** dentro del flujo automático. Puede deberse a:
 - Falta de información obligatoria para completar el registro.
 - Errores o inconsistencias durante la generación del documento/registro.
 - Pendientes de validación o algún paso manual faltante.

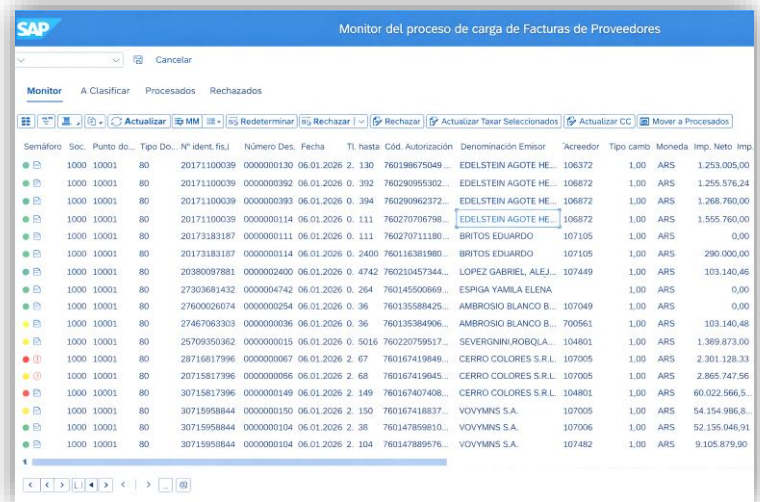

Semáforo	Soc.	Punto de...	Tipo Do...	Nº Ident. fis.	Número Des.	Fecha	Ti. hasta	Cód. Autorización	Denominación Emisor	Acreedor	Tipo camb	Moneda	Imp. Neto	Imp.
Verde	1000	10001	80	20171100039	0000000130	06.01.2026	2. 130	760198675049...	EDELSTEIN AGOTE HE...	106372	1,00	ARS	1.253.005,00	
Verde	1000	10001	80	20171100039	0000000392	06.01.2026	0. 392	760290955302...	EDELSTEIN AGOTE HE...	106872	1,00	ARS	1.255.576,24	
Verde	1000	10001	80	20171100039	0000000393	06.01.2026	0. 394	760290962372...	EDELSTEIN AGOTE HE...	106872	1,00	ARS	1.268.760,00	
Verde	1000	10001	80	20171100039	0000000114	06.01.2026	0. 111	7602707076798...	EDELSTEIN AGOTE HE...	106872	1,00	ARS	1.555.760,00	
Verde	1000	10001	80	20173183187	0000000111	06.01.2026	0. 111	7602707111180...	BRITOS EDUARDO	107105	1,00	ARS	0,00	
Verde	1000	10001	80	20173183187	0000000114	06.01.2026	0. 2400	7601163819880...	BRITOS EDUARDO	107105	1,00	ARS	290.000,00	
Verde	1000	10001	80	2038097881	0000002400	06.01.2026	0. 4742	760210457344...	LOPEZ GABRIEL, ALEJ...	107449	1,00	ARS	103.140,46	
Verde	1000	10001	80	27303681432	0000004742	06.01.2026	0. 264	760145500669...	ESPIGA YAMILA ELENA	107005	1,00	ARS	0,00	
Verde	1000	10001	80	27600026074	0000000254	06.01.2026	0. 36	760135588425...	AMBROSIO BLANCO B...	107049	1,00	ARS	0,00	
Verde	1000	10001	80	27467063303	0000000036	06.01.2026	0. 36	760135384906...	AMBROSIO BLANCO B...	700561	1,00	ARS	103.140,48	
Amarillo	1000	10001	80	25709350362	0000000015	06.01.2026	0. 5016	760220759517...	SEVERONINROBOLA...	104801	1,00	ARS	1.389.873,00	
Amarillo	1000	10001	80	28715817396	0000000067	06.01.2026	2. 67	760167419849...	CERRO COLORES S.R.L.	107005	1,00	ARS	2.301.128,33	
Amarillo	1000	10001	80	20715817396	0000000066	06.01.2026	2. 68	760167419845...	CERRO COLORES S.R.L.	107005	1,00	ARS	2.865.747,56	
Amarillo	1000	10001	80	30715817396	0000000149	06.01.2026	2. 149	760167407408...	CERRO COLORES S.R.L.	104801	1,00	ARS	60.022.566,5...	
Amarillo	1000	10001	80	30715958844	0000000150	06.01.2026	2. 150	760167418837...	VOVYMS S.A.	107005	1,00	ARS	54.154.986,8...	
Verde	1000	10001	80	30715958844	0000000104	06.01.2026	2. 38	760147859810...	VOVYMS S.A.	107006	1,00	ARS	52.136.046,91	
Verde	1000	10001	80	30715958844	0000000104	06.01.2026	2. 104	760147889576...	VOVYMS S.A.	107482	1,00	ARS	9.105.879,90	

- **Rojo:**
Factura emitida por el proveedor y registrada en ARCA/AFIP, pero que luego de X días (tiempo customizable) aún no se ha recibido y/o procesado en SAP.

El reporte permitirá filtrar y analizar información por proveedor, período, estado, responsable del proveedor, tipo de comprobante y otros criterios relevantes para la gestión.

✓ Gestión de Excepciones y Seguimiento

- Visualización detallada de los comprobantes en estado amarillo o rojo para su análisis.
- Identificación clara del motivo del desvío (no recibido, error de lectura, inconsistencia fiscal, error de contabilización, etc.).
- Trazabilidad completa del comprobante a lo largo del proceso.

✓ Alertas y Notificaciones Automáticas (Opcional)

- Configuración de notificaciones automáticas a proveedores, para solicitar el reenvío/compartición de comprobantes que, después de X días desde su emisión, aún no hayan sido recibidos en la casilla de Office 365
- Posibilidad de alertas internas para el equipo de cuentas a pagar ante comprobantes con errores recurrentes o críticos.
- Reducción de la gestión manual de seguimiento y reclamos a proveedores.

✓ **Beneficios del Monitor**

- Mayor control y transparencia del ciclo de facturación de proveedores.
- Prevención de omisiones fiscales y operativas (mejor aprovechamiento del crédito fiscal).
- Mejora en la gestión proactiva con proveedores.
- Alineación entre la información fiscal oficial y los registros en SAP.
- Control de los tiempos de carga de comprobantes.

Importante: El ingreso de facturas a SAP se gestionará inicialmente mediante las transacciones MIRO y FB60. Las facturas simples y sin inconsistencias se cargarán de forma automática a través del flujo definido. Sin embargo, aquellos casos que presenten mayor complejidad requieran validaciones adicionales o un análisis por parte de un profesional, quedarán en estado pendiente y deberán ser confirmados manualmente para completar su procesamiento y registro en SAP.

5.3. Fuera de Alcance

A continuación, se detalla la funcionalidad no incluida en el alcance.

- No se incluye ningún otro submódulo ni funcionalidad que no esté detallada en la propuesta
- No se incluye en el alcance configuraciones funcionales para modificar el comportamiento actual de los procesos. Los procesos se utilizarán de acuerdo con cómo están configurados actualmente.
- No se incluye el análisis y ajustes en desarrollos existentes que deban ser considerados para la nueva funcionalidad.
- No se contempla el análisis y desarrollo de interfaces con otros sistemas no SAP.
- Actividades Basis: No se encuentra estimado en esta propuesta las tareas Basis, que eventualmente se pudieran requerir para la ejecución del proyecto (aplicación de notas, transportes, configuraciones de los ambientes, etc.).

5.4. Idioma, geografía, días y horarios

Idioma

El servicio se brindará en idioma español, en caso de requerirse alguna actividad en otro idioma deberá pactarse entre RUN BUSINESS SOLUTIONS y SOYCHU.

Geografía

El servicio se brindará en Argentina. En caso de requerirse actividades que conlleven conocimiento de localización de países diferentes, al propuesto, deberá acordarse entre RUN BUSINESS SOLUTIONS y SOYCHU.

Las actividades se realizarán de manera remota en un 100%.

Días y horario del servicio

El servicio se brindará de lunes a viernes en el horario de 9:00hs a 18:00hs de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

No se consideran dentro de la cobertura del servicio días feriados establecidos por la legislación de Argentina de acuerdo con la agenda publicada por el ministerio del interior de la Nación Argentina.

6. Estrategia de Implementación

6.1. Metodología

Para cada uno de los puntos descriptas, en el apartado "5. Objetivo y alcance de la propuesta", se elaborará un documento de diseño, donde se detallará, con mayor precisión, la solución a implementar, tomando como base esta propuesta.

Los documentos de diseño se deberán aprobar antes de proceder a la realización (configuración y/o desarrollo) de las aplicaciones.

Luego de implementada la solución se realizará una prueba unitaria por parte del equipo de consultoría.

Una vez finalizada las pruebas unitarias, se procederá con las pruebas integrales las cuales estarán a cargo de los key users designados por SOYCHU.

Los key users serán responsables de capacitar a los usuarios finales, para lo cual deberán comprender las soluciones implementadas a cabalidad.

6.2. Cronograma del proyecto

Se estima un proyecto con una duración de xxxxxx más una semana de soporte post go live. El cronograma detallado se elaborará durante la fase de preparación inicial del proyecto.

6.3. Entregables

Durante la ejecución de la solución propuesta se prevén los siguientes entregables:

- Documento especificación funcional de los Ajustes mínimos realizados y aprobados
- Documento de pruebas funcionales unitarias.
- Documentación técnica de los Ajustes mínimos realizados y aprobados
- Capacitación a usuarios Clave y manuales de Usuario.

6.4. Equipo de proyecto

A continuación, se detalla el equipo propuesto para el proyecto:

Rol	Empresa
Project Manager	RUN BUSINESS SOLUTIONS
Consultor ABAP	RUN BUSINESS SOLUTIONS
Consultor IA	RUN BUSINESS SOLUTIONS

Consultor FICO	RUN BUSINESS SOLUTIONS
Consultor MM	RUN BUSINESS SOLUTIONS
Project Manager	SOYCHU
Usuarios clave (por modulo)	SOYCHU
SAP Basis	SOYCHU
SAP Seguridad (Roles & Perfiles)	SOYCHU

7. Premisas y Supuestos

7.1. Organización del trabajo

- **Grupo de Trabajo:** Al inicio del proyecto se definirán los recursos dedicados al proyecto por parte del cliente. Se definirán los recursos con nombre y apellido, cargo y autoridad en las definiciones, así como canales de comunicación. Dichos recursos deberán estar disponibles para cumplimentar tareas relacionadas al proyecto, definiendo en el comienzo la necesidad de manejar una asignación parcial o total durante las distintas etapas. Cualquier modificación de recursos que impacte en las definiciones o en la continuidad de las tareas será evaluada oportunamente y deberán ser asumidos por El cliente los costos incurridos adicionales por estas demoras.

Adicionalmente se podrán requerir de forma puntual, personas del cliente con conocimiento de cualquier otra funcionalidad del sistema SAP y/o de algún proceso específico de negocio.

Para el desarrollo del diseño conceptual, se requiere participación del personal del cliente que conozca técnica y funcionalmente los aplicativos contemplados en el alcance.

RUN BUSINESS SOLUTIONS asignará para el proyecto consultores que posean los conocimientos de las soluciones SAP requeridos para el desarrollo del proyecto y que hayan tenido experiencia en proyectos similares.

Una vez formalizada la aceptación de esta propuesta por parte de SOYCHU, RUN BUSINESS SOLUTIONS se reserva un período aproximado de 30 (treinta) días para realizar el staffing e inducción de los recursos necesarios.

RUN BUSINESS SOLUTIONS es único responsable por la selección y administración de sus recursos.

Los integrantes del equipo de proyecto del cliente serán los encargados de programar y citar a las actividades de capacitación de los usuarios finales; al igual que de cubrir la logística necesaria para los mismos: (materiales, salones, agendas, contenidos, entre otros).

- **Lugar de Desarrollo:** el proyecto será cumplimentado remotamente. La infraestructura y configuración necesaria para el desarrollo remoto será provisto por el cliente. Si por razones operativas el cliente requiriera que parte de las tareas descriptas en esta propuesta fueran realizadas en otro lugar no previsto, RUN BUSINESS SOLUTIONS cotizará el costo adicional correspondiente a los viáticos relacionados a dichos traslados.

- **Lugar de Reuniones:** RUN BUSINESS SOLUTIONS asume que los esfuerzos previstos para reuniones tanto de análisis como de seguimiento del proyecto se darán en las oficinas del cliente. Si por razones operativas el cliente requiriera que parte de estas reuniones fueran realizadas en otro lugar no previsto, RUN BUSINESS SOLUTIONS cotizará el costo adicional correspondiente a los viáticos relacionados a dichos traslados.
- **Horario de Trabajo:** Todas las tareas y servicios a cargo de RUN BUSINESS SOLUTIONS se efectuarán, de lunes a viernes con excepción de los días no hábiles en el horario de 9hs a 18hs. Si por razones operativas el cliente requiriera que parte de las tareas descritas en esta propuesta fueran realizadas fuera de los días y horarios especificados, RUN BUSINESS SOLUTIONS cotizará el costo adicional correspondiente.
- **Presentaciones y Reuniones Especiales:** RUN BUSINESS SOLUTIONS no contempla en las estimaciones del proyecto, tiempos adicionales para asistir a reuniones especiales o presentaciones no previstas en el cronograma del proyecto. Si el cliente requiriera de la presencia de RUN BUSINESS SOLUTIONS en reuniones internas o con usuarios potenciales para la presentación del proyecto o debate sobre el mismo, no habrá inconveniente alguno en participar y colaborar en las mismas. Sin embargo, dichas reuniones no forman parte de las estimaciones bajo las cuales se presupuesta el proyecto. RUN BUSINESS SOLUTIONS no tiene inconveniente alguno de acompañar a SOYCHU en estas tareas, pero al no poder dimensionar el esfuerzo que puede llevar cumplirlas las excluye del presupuesto y serán cotizadas eventualmente según las necesidades del cliente.

7.2. Definiciones y entregables del proyecto

- **Requerimientos:** Se asume que los requerimientos son los definidos en la presente propuesta sin considerar la necesidad de relevamiento de nuevos requerimientos o modificaciones sobre lo especificado.
- **Impacto en aplicativos del cliente:** RUN BUSINESS SOLUTIONS no realizará modificaciones sobre otros sistemas legacy actuales. En caso de requerirse cualquier cambio a la luz del desarrollo del proyecto, éste deberá hacerse por parte del cliente. dentro de los plazos necesarios para evitar retrasos en el proyecto. Cualquier impacto será gestionado con base en el procedimiento de control de cambios.
- **Documentación Entregable:** Toda la documentación sobre el proyecto estará definida en idioma español y bajo la metodología utilizada por RUN BUSINESS SOLUTIONS. Si eventualmente el cliente requiriera de documentos complementarios ajenos a los definidos en esta propuesta, o bien, bajo formatos u idiomas distintos, se evaluará oportunamente el impacto de elaborarlos (en esfuerzo y plazos) presupuestándose separadamente.
- **Controles de Cambios:** Si durante el proyecto surgieran nuevos requerimientos (en cualquier etapa de este), dichos requerimientos podrán ser evaluados de forma independiente a la presente propuesta como controles de cambios. Se evaluarán los esfuerzos adicionales para las etapas que sean afectadas por el cambio. Se considera un cambio a cualquier modificación sobre definiciones del proyecto y consensuadas con el cliente.

7.3. Tiempos

- **Planificación:** La planificación presentada en esta propuesta está basada en una ejecución continua del proyecto, sin interrupciones. Si se presentase alguna situación que impida el desarrollo continuo del proyecto esta deberá ser analizada por los Gerentes del Proyecto, informando el impacto en recursos y costos adicionales al Comité de Dirección.
- **Entregables:** Los entregables de cada fase son insumo para el desarrollo de la siguiente. Las modificaciones a entregables ya aprobados previamente, podrán generar desviaciones en el proyecto que incidan en aumentos de costos y ampliación de plazos. Esto será evaluado por los Gerentes del Proyecto, y su impacto se presentará al Comité de Proyecto si lo amerita, para establecer las acciones a seguir.
- **Conflictos:** La toma de decisiones o resolución de problemas, no debe tomar más de 2 (dos) días hábiles; mientras dependa de cualquier integrante del Comité de Dirección del proyecto, este factor se puede minimizar en buena medida por el poder de decisión que tengan los usuarios claves vinculados al proyecto. El Comité de Dirección deberá estar conformado por Gerentes o jefes de las Áreas afectadas, de tal forma que puedan tomar decisiones de cambios a los procesos para agilizar el desarrollo del proyecto.
- **Infraestructura:** Disponer de la infraestructura tecnológica (Servidores, PCs, red, comunicaciones y buen tiempo de respuesta) recomendada por SAP en los tiempos y condiciones requeridas. El no contar con ella afectará los tiempos de parametrización, pruebas y entrada en producción.
- **Pruebas:** Las pruebas de integración y aceptación son responsabilidad de los líderes de proceso asignados por el cliente al proyecto; en la medida en que se agilice la definición de la estrategia de pruebas, preparación de casos y se ejecuten dentro de los tiempos asignados para ello, se tendrá mayor tiempo para la preparación de la entrada en producción.

7.4. Desarrollo del proyecto

- **Entornos de Trabajo:** el cliente brindará una conexión VPN para que los consultores de RUN BUSINESS SOLUTIONS que trabajen en modalidad "Remote" puedan acceder, al menos, a los ambientes de desarrollo y testing SAP. Se contará con usuarios desarrolladores de las licencias SAP para los consultores de RUN BUSINESS SOLUTIONS con acceso al ambiente de configuración (desarrollo). Los trabajos se realizarán directamente sobre los ambientes de Desarrollo y Testing de SAP. El cliente debe asegurar la consistencia entre los distintos ambientes utilizados.
- Para la correcta ejecución del proyecto, el cliente deberá proveer acceso al ambiente de **Azure** correspondiente, así como también habilitar una **casilla de correo** que sea accesible de manera remota. Esto es necesario para el desarrollo del **agente de facturación** y para establecer la conexión con los servicios de **Office 365** que se definan y designen durante el proyecto.
- **Disponibilidad de Imágenes y Logos:** Se asume que en el caso en que el cliente requiera de imágenes sobre el diseño, así como el logo de la marca, todo será provisto listo para ser usado en la web y bajo los formatos adecuados. Licencias de imágenes y fotografías, diseño de logos, consultoría de imagen, campaña de marketing y comunicación, etc. estarán a cargo del cliente.

- **Performance:** La performance de la aplicación puede estar determinada por varios factores entre los cuales se cuentan: conectividad, equipos, otras aplicaciones corriendo en los mismos equipos, etc. no siendo responsabilidad de RUN BUSINESS SOLUTIONS responder por dichos factores ni evaluar su impacto al no disponer de información ni acceso. Sin embargo, el cliente deberá informar a RUN BUSINESS SOLUTIONS todos los factores que la aplicación debe contemplar como cantidad de usuarios totales y concurrentes, cantidad de transacciones simultáneas posibles en un momento dado, etc.

7.5. Aspectos técnicos

- **Programas Standard modificados:** se supone que no existen programas Standard modificados. Si existiesen, los tiempos de trabajo necesario sobre los mismos serán estimados y cotizados oportunamente por RUN BUSINESS SOLUTIONS.
- **SAP Marketplace:** RUN BUSINESS SOLUTIONS deberá tener acceso al Marketplace de SAP mediante un usuario OSS de SOYCHU para bajar notas y parches a medida que sean necesarios.
- **Disponibilidad de Ambientes:** el cliente deberá disponibilizar a RUN BUSINESS SOLUTIONS los ambientes DEV, QAS y PRD de SAP S/4 HANA para la ejecución del proyecto. RUN BUSINESS SOLUTIONS asume que el ambiente QAS (utilizados para las pruebas integrales) es un ambiente de similares características que el ambiente PRD. De no ser así podría traer inconvenientes tanto en la etapa de pruebas integrales como en la salida en productivo.
- **Software- Licencias:** la oferta de RUN BUSINESS SOLUTIONS se limita a la cotización de los Servicios de Consultoría según el alcance detallado en nuestra Propuesta. El Licenciamiento de SAP, el Mantenimiento de dichas Licencias y la Infraestructura de Hardware y Comunicaciones necesarias para el correcto funcionamiento de SAP, no forma parte de la presente propuesta y deberá ser contratado en forma independiente por SOYCHU.
- **Back ups:** La presente propuesta no contempla responsabilidad de RUN BUSINESS SOLUTIONS sobre los back ups de la aplicación y los datos de esta para asegurar su integridad. Será responsabilidad del cliente el resguardo de la información de cada una de las instancias SAP como así también la definición e implementación de planes de Disaster Recovery o alta disponibilidad de los servidores Productivos.

8. Propuesta Económica

El valor del servicio está estimado de acuerdo con el alcance establecido. El servicio se entregará bajo modalidad "Llave en mano", cualquier cambio a lo definido en la propuesta técnica tendrá un impacto directo sobre la estimación y costo de la presente propuesta.

Se debe considerar que los costos asociados al uso de Inteligencia Artificial y a la ejecución/consumo de infraestructura requerida para el procesamiento de facturas (servicios en la nube, licenciamiento y/o componentes asociados) corresponderán a un cargo mensual recurrente, el cual será asumido por el cliente.

Descripción	Importe Mensual
SAP Automatización y Monitoreo de Facturas de proveedores	xxxxxx

- Los valores aquí expresados no incluyen IVA, ni ningún otro impuesto.
- La facturación se realizará de acuerdo con el siguiente esquema de cumplimiento de hitos:
 - 50% al inicio del proyecto
 - 50% al finalizar el proyecto
- El plazo de pago será de 30 días fecha de factura.
- A todo evento se deja establecido que, en caso de no permitir u obstruir a que la facturación se efectuase dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, se generará en favor de RUN BUSINESS SOLUTIONS el interés correspondiente a la Tasa Activa de Banco de la Nación Argentina vigente.
- La presente propuesta no contempla ningún gasto asociado a viajes de los consultores requeridos o solicitados por SOYCHU. En caso de ser necesario algún viaje dichos gastos (pasajes, hotel, perdiem/viáticos, traslados, etc.) serán cubiertos por SOYCHU.
- La presente propuesta tiene validez por 30 días.



¡Gracias por confiar en nosotros!

Mauro Vila

Director Comercial

Mobile AR +54 911 2648-0625

Email: mauro.vila@runbss.com

Jonathan Ivrea

Business Development SAP

Mobile ES +34 689 438 578

Mobile CO +57 320 884 2295

Email: jonathan.ivrea@runbss.com

Exequiel Ceruse

Director de Operaciones & Pre Venta

Mobile AR +54 911 5919-4010

Email: exequiel.ceruse@runbss.com
